

# Reunião do Conselho Universitário

**CSTI / AI**

**PDI 2011: Tecnologia da Informação**

01.dezembro.2011

# Execução do Programa

Ação	Previsto	Realizado	%
1. Melhorar a infraestrutura de comunicação	8.301.421,00	8.282.871,68	99,8
2. Usar TI para aprimorar processos	648.579,00	451.464,70	69,6
3. Priorizar o uso de software livre	50.000,00	28.636,47	57,3
<b>TOTAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.762.972,85</b>	<b>97,4%</b>

# Implantação das Ações

## 1. Melhorar a infraestrutura de comunicação

Metas	Previsto	Realizado	%
Ativos de rede (switches)	1461	1007	68,9
Cabeamento óptico	4	4	100,0
Infraestrutura de STIs	6	6	100,0
Telefonia IP	8421	6037	71,7
Videoconferência	39	33	84,6
Rede sem fio	271	80	29,5
<b>Implantação da Ação 1</b>			<b>75,8%</b>

# Implantação das Ações

## 2. Usar TI para aprimorar processos

Metas	Previsto	Realizado	Indicador
Desenvolvimento de sistemas	-	-	72,4%
Reuniões e workshops	72	72	100,0%
Capacitações e treinamentos	13	12	92,3%
<b>Implantação da Ação 2</b>			<b>88,2%</b>

# Implantação das Ações

## Implantação de Sistemas Institucionais

Sistema	TDS (%)	NUP	NUI	TIS (%)	Indicador (%)
SISOFC	80,0	35	35	100,0	88,0
SISGRAD	100,0	35	20	57,1	82,9
SISPG	100,0	27	1	3,7	61,5
RH	25,0	0	-	0,0	15,0
PROEX	90,0	3	3	100,0	94,0
SGCD	100,0	37	7	18,9	67,6
ADM-Patrimônio	100,0	35	35	100,0	100,0
ADM-Contratos	60,0	1	1	100,0	76,0
ADM-Compras	90,0	4	1	25,0	64,0
ADM-Diárias e Ressarcimento	95,0	1	1	100,0	97,0
SIGAD	45,0	0	-	0,0	27,0
SASD	100,0	34	30	88,2	95,3
<b>Implantação de Sistemas Institucionais = <math>0,6 * TDS + 0,4 * TIS</math></b>					<b>72,4%</b>

# Implantação das Ações


## 3. Priorizar o uso de software livre

Metas	Previsto	Realizado	Indicador
Seminários (padrão ODF)	37	31	83,8%
Treinamentos em software livre	2	2	100,0%
<b>Implantação da Ação 3</b>			<b>91,9%</b>

# Resumo do Programa em 2011

Ação	R\$	%	Metas realizadas
Melhorar a infraestrutura de comunicação	8.282.871,68	99,8	75,8%
Usar TI para aprimorar processos	451.464,70	69,6	88,2%
Priorizar o uso de software livre	28.636,47	57,3	91,9%
<b>TOTAL</b>	<b>8.762.972,85</b>	<b>97,4%</b>	<b>85,3%</b>

# Como estamos

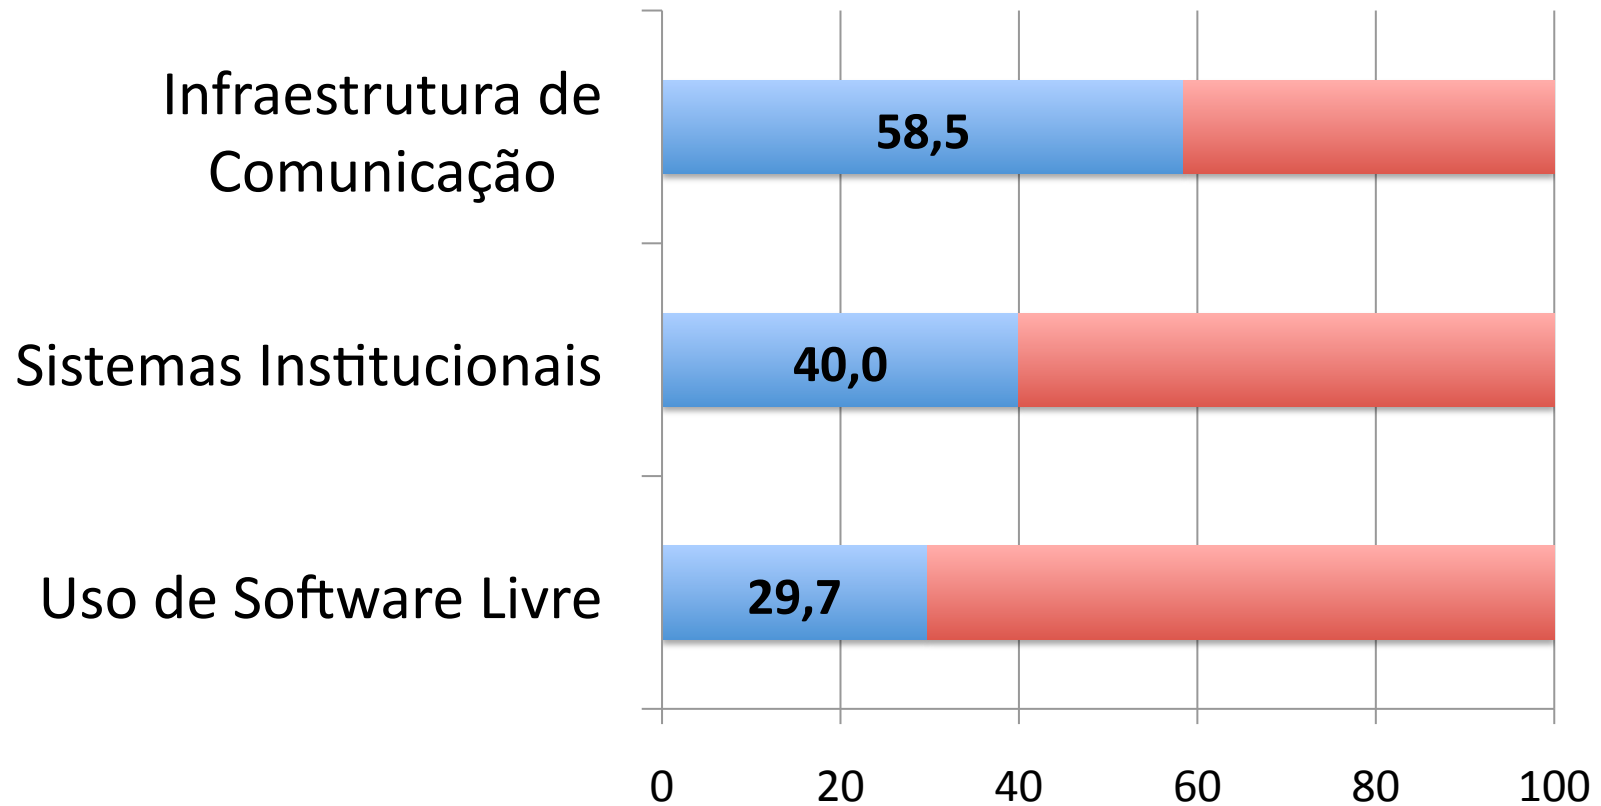

# Como estamos

Ação	Meta	Objetivo	Atual	%
Infraestrutura de Comunicação	Ativos de rede (switches)	1542	1461	94,7
	Cabeamento óptico	37	4	10,8
	Infraestrutura de STIs	37	6	16,2
	Telefonia IP	10400	8421	81,0
	Videoconferência	40	39	97,5
	Rede sem fio	1200	611	50,9
	<b>TOTAL</b>			
Sistemas Institucionais	Desenvolvimento/Implantação	45	18	<b>40,0%</b>
Uso de Software Livre	Seminários (padrão ODF)	37	31	83,8
	Treinamentos em software livre	37	2	5,4
	Implantação de software livre	37	0	0,0
	<b>TOTAL</b>			
